VNPT HƯNG YÊN
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG MỸ HÀO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /BC-VTKV MH

Mỹ Hào, ngày 10 tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT
Về việc chuyển vị trí xây dựng cột BTS từ Nhà văn hóa Tổ dân phố Văn Nhuế đến vị trí đất vỉa hè thuộc hành lang đường Phó Đức Chính, phường Mỹ Hào (phía Nam đường) cạnh Ngân hàng Vietcombank

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Hào

Căn cứ Văn bản số **1903/SKHCN-CĐSBCVT** ngày 15/6/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên về việc xác định sự phù hợp đối với các trạm thu, phát sóng thông tin di động;

Căn cứ Văn bản số **1066/UBND-KT,HT&ĐT** ngày 11/5/2026 của UBND phường Mỹ Hào về việc phối hợp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm BTS Vinaphone theo quy định;

Căn cứ văn bản số **2759/SKHCN-CĐSBCVT** ngày 14/7/2026 V/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nâng cao Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2026

Thực hiện chủ trương phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn, ngày **22/5/2026**, Trung tâm Viễn thông Mỹ Hào đã tổ chức triển khai thi công công trình xây dựng trạm BTS tại **Nhà văn hóa Tổ dân phố Văn Nhuế**.

Thực hiện chủ trương phát triển hạ tầng viễn thông, nâng cao năng lực và chất lượng vùng phủ sóng thông tin di động trên địa bàn phường Mỹ Hào, Trung tâm Viễn thông Mỹ Hào báo cáo và đề xuất UBND phường Mỹ Hào việc chuyển vị trí xây dựng trạm BTS, cụ thể như sau:

1. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ KHÓ KHĂN TẠI VỊ TRÍ CŨ

Ngày **22/5/2026**, Trung tâm Viễn thông Mỹ Hào đã triển khai thi công công trình trạm BTS tại **Nhà văn hóa Tổ dân phố Văn Nhuế**. Trong quá trình thi công phần móng, một số hộ dân tập trung phản đối, ngăn cản do lo ngại ảnh hưởng của sóng điện từ đến sức khỏe.

Trung tâm Viễn thông Mỹ Hào đã phối hợp với cấp ủy, tổ dân phố tuyên truyền, giải thích và cung cấp các căn cứ, quy định của cơ quan quản lý nhà nước về việc xây dựng, vận hành trạm BTS, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật và an toàn bức xạ điện từ. Đồng thời, VNPT Hưng Yên đã ban hành **Văn bản số 1553/CV-VNPT HYN-KTĐT ngày 28/5/2026** gửi các hộ dân, cam kết thực hiện và chịu

trách nhiệm về việc bảo đảm an toàn bức xạ điện từ của trạm BTS theo quy định.

Ngày **31/7/2026**, Trung tâm tiếp tục phối hợp với cấp ủy Chi bộ và Tổ trưởng Tổ dân phố Văn Nhuế xác định lại vị trí để triển khai thi công. Tuy nhiên, khoảng 10 người dân tiếp tục tập trung, yêu cầu dừng và không chấp thuận xây dựng trạm BTS tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Văn Nhuế.

Mặc dù đã tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích về các quy định của Nhà nước, tính an toàn và sự cần thiết của công trình, các hộ dân vẫn chưa đồng thuận, dẫn đến **không thể tiếp tục triển khai tại vị trí cũ**, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư và kế hoạch nâng cao vùng phủ sóng.

2. VỊ TRÍ ĐỀ XUẤT THAY THẾ

Để bảo đảm yêu cầu phát triển hạ tầng viễn thông, nâng cao chất lượng vùng phủ sóng Vinaphone tại khu vực đô thị, khu dân cư đông người, Trung tâm Viễn thông Mỹ Hào đã khảo sát và phối hợp với Tổ dân phố Văn Nhuế xác định vị trí thay thế.

Vị trí đề xuất: Khu vực **phía Nam đường Phó Đức Chính, cạnh Ngân hàng Vietcombank**, thuộc khu vực đất hành lang đường và vỉa hè; vị trí, tọa độ cụ thể thể hiện tại tài liệu kèm theo.

Quy mô: Cột BTS loại **Monopole tự đứng, chiều cao 30 m**, cùng các thiết bị, hạng mục phụ trợ theo thiết kế và quy định hiện hành.

Vị trí đề xuất đáp ứng yêu cầu thay thế vị trí cũ, góp phần bảo đảm vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin di động tại khu vực và thuận lợi cho công tác quản lý, vận hành công trình.

3. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trung tâm Viễn thông Mỹ Hào kính đề nghị **Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hào**:

- Xem xét, chấp thuận chủ trương và vị trí xây dựng trạm BTS tại khu vực phía Nam đường Phó Đức Chính, cạnh Ngân hàng Vietcombank, thuộc khu vực đất hành lang đường và vỉa hè, theo vị trí và tọa độ gửi kèm.

- Quan tâm, tạo điều kiện và hướng dẫn Trung tâm thực hiện các thủ tục cần thiết để sử dụng vị trí và triển khai xây dựng công trình theo đúng quy định.

- Sau khi được chấp thuận, Trung tâm cam kết triển khai công trình đúng vị trí, quy mô, thiết kế; tuân thủ các quy định về hạ tầng viễn thông, xây dựng, an toàn giao thông, an toàn bức xạ điện từ; bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn trong quá trình thi công, vận hành.

Việc sớm chấp thuận vị trí đề xuất sẽ tạo điều kiện để Trung tâm triển khai công trình thay thế vị trí cũ, bảo đảm tiến độ đầu tư, nâng cao chất lượng vùng

phủ sóng và đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trung tâm Viễn thông Mỹ Hào kính báo cáo và đề nghị **Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Hào quan tâm xem xét, chấp thuận** để đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi (để báo cáo);
- BGĐ VNPT HYN để (b/c);
- Lưu: VTMH.

GIÁM ĐỐC

Phí Ngọc Hiếu

Mẫu cột BTS tự đứng Monopole
Kèm theo văn bản 09/BC-VTMH ngày 10 tháng 8 năm 2026

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG MÓNG CỘT BTS

CHI TIẾT THÉP MÓNG M0

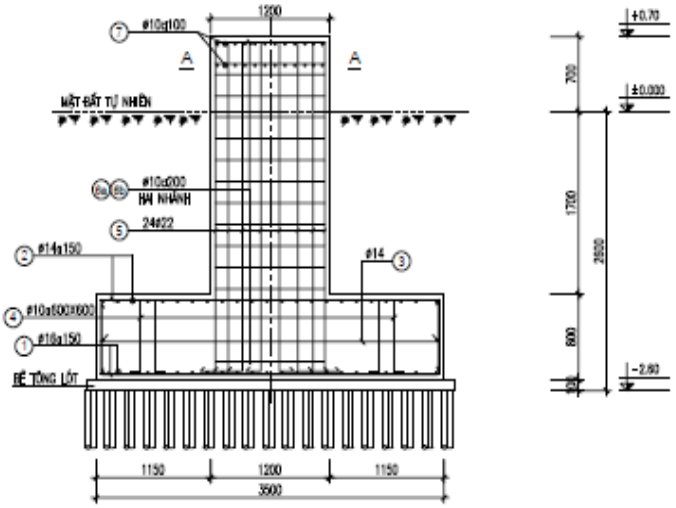

MẶT CẮT A-A

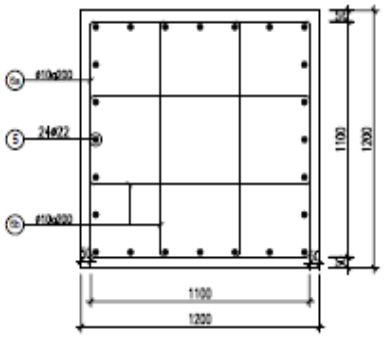

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP BẢN MÓNG M0

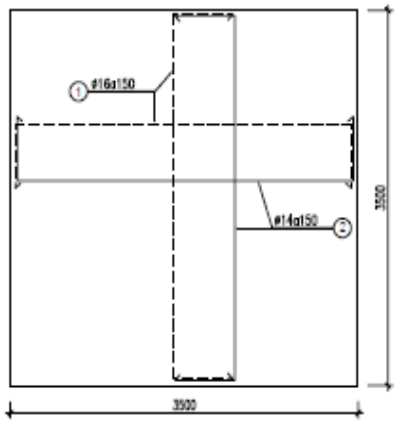

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN C.KIỆN	SỐ HIỆU	HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC	ĐƯỜNG KÍNH (mm)	CHIỀU DÀI 1 THANH (mm)	SỐ LƯỢNG 1 C.KIỆN	SỐ LƯỢNG T.BỘ	TỔNG CHIỀU DÀI (m)	TỔNG T.LƯỢNG (Kg)
Móng cột Strong 1	1	700 3400 700	16	4800	46	46	220.8	348.50
	2	700 3400 700	14	4800	46	46	220.8	266.62
	3	500 3400 500	14	4400	4	4	17.6	21.27
	4	150 700 150 700 150	14	1850	20	20	37	44.71
	5	300 3100	22	3400	24	24	81.6	243.50
	5A	1100 1100 80	10	4560	15	15	68.4	42.17
	5B	1100 340 80	10	3040	30	30	91.2	56.23
	7	1100	10	1100	48	48	52.8	32.55

- Trọng lượng thép có đường kính Φ10 = 130.95 kg; Chiều dài = 212.4 mét
- Trọng lượng thép có đường kính Φ14 = 332.8 kg; Chiều dài = 275.4 mét
- Trọng lượng thép có đường kính Φ16 = 348.5 kg; Chiều dài = 220.8 mét
- Trọng lượng thép có đường kính Φ22 = 243.5 kg; Chiều dài = 81.6 mét

GHI CHÚ:

- BÊ TÔNG MÓNG DÙNG CẤP ĐỘ BỀN B20 (MÁC 250)
- BÊ TÔNG LÓT DÙNG CẤP ĐỘ BỀN B7.5 (MÁC 100)
- CỐT THÉP CB240–T CHO THÉP Φ<10
- CỐT THÉP CB300–V CHO THÉP 10<= Φ
- CỐT THÉP ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN NỐI CHỒNG L>30D.
- LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ CỐT THÉP MÓNG LÀ 50MM.
- MÓNG ĐƯỢC THIẾT KẾ VỚI GIÁ THIẾT SỨC CHỊU TẢI ĐẤT NỀN r=0.8kg/cm2, TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG, NẾU LỚP ĐẤT ĐÁY MÓNG CÓ SỨC CHỊU TẢI NHỎ HƠN 0.8kg/cm2 THÌ ĐƠN VỊ THI CÔNG CẦN BÁO LẠI CHO CHỦ ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐỂ CÓ BIỆN PHÁP XỬ LÝ.
- KÍCH THƯỚC BẢN VẼ GHI BẰNG MM./

MẶT BẰNG TỔNG THỂ VỊ TRÍ CỘT BTS
Đường Phó Đức Chính, phường Mỹ Hào (phía Nam đường) cạnh Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

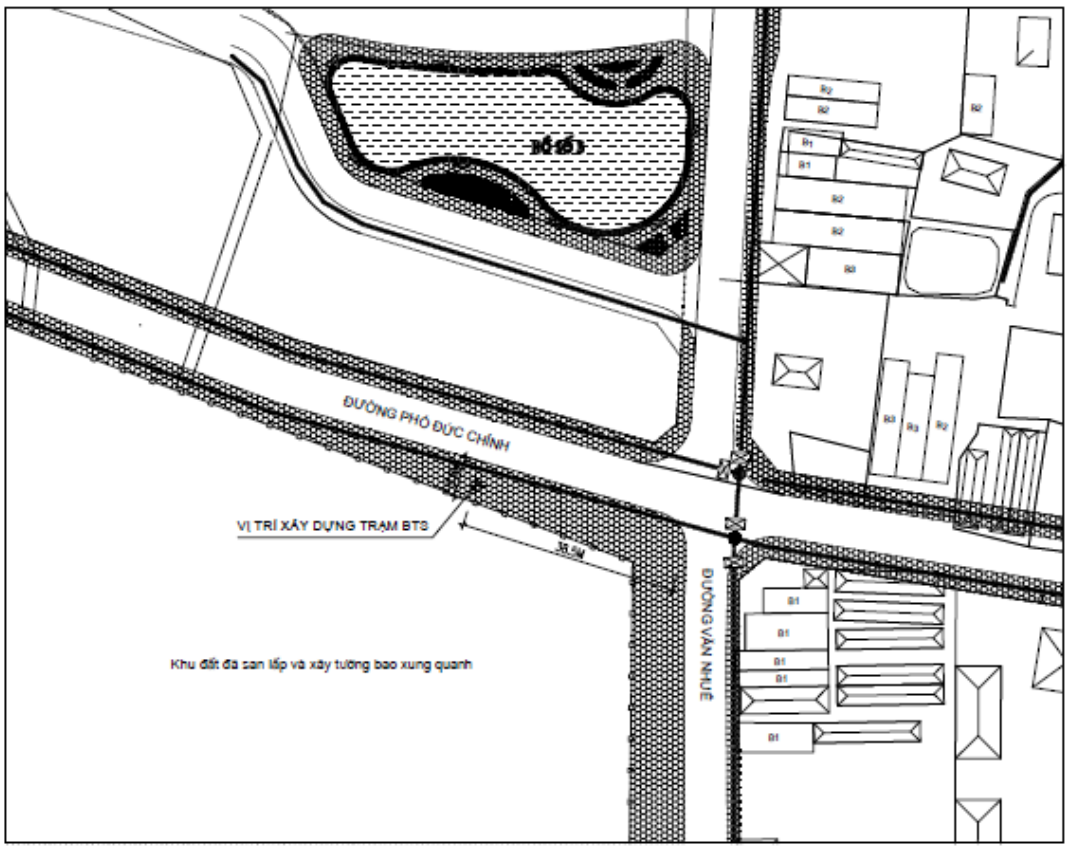

GHI CHÚ:

– ĐỊA ĐIỂM: TDP VĂN NHUỆ, PHƯỜNG MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN.
– TỌA ĐỘ VỊ TRÍ XÂY DỰNG TRẠM: 20.936424° 106.053141°
– ĐẤT CẤP 2.
– KHOẢNG CÁCH VẬN CHUYỂN:
+ KCN VĨNH KHÚC – VỊ TRÍ THI CÔNG : 7KM ĐƯỜNG CẤP 2.
– CÁC KÍCH THƯỚC TRONG BẢN VẼ CÓ ĐƠN VỊ LÀ MM, CAO ĐỘ CÓ ĐƠN VỊ LÀ M.
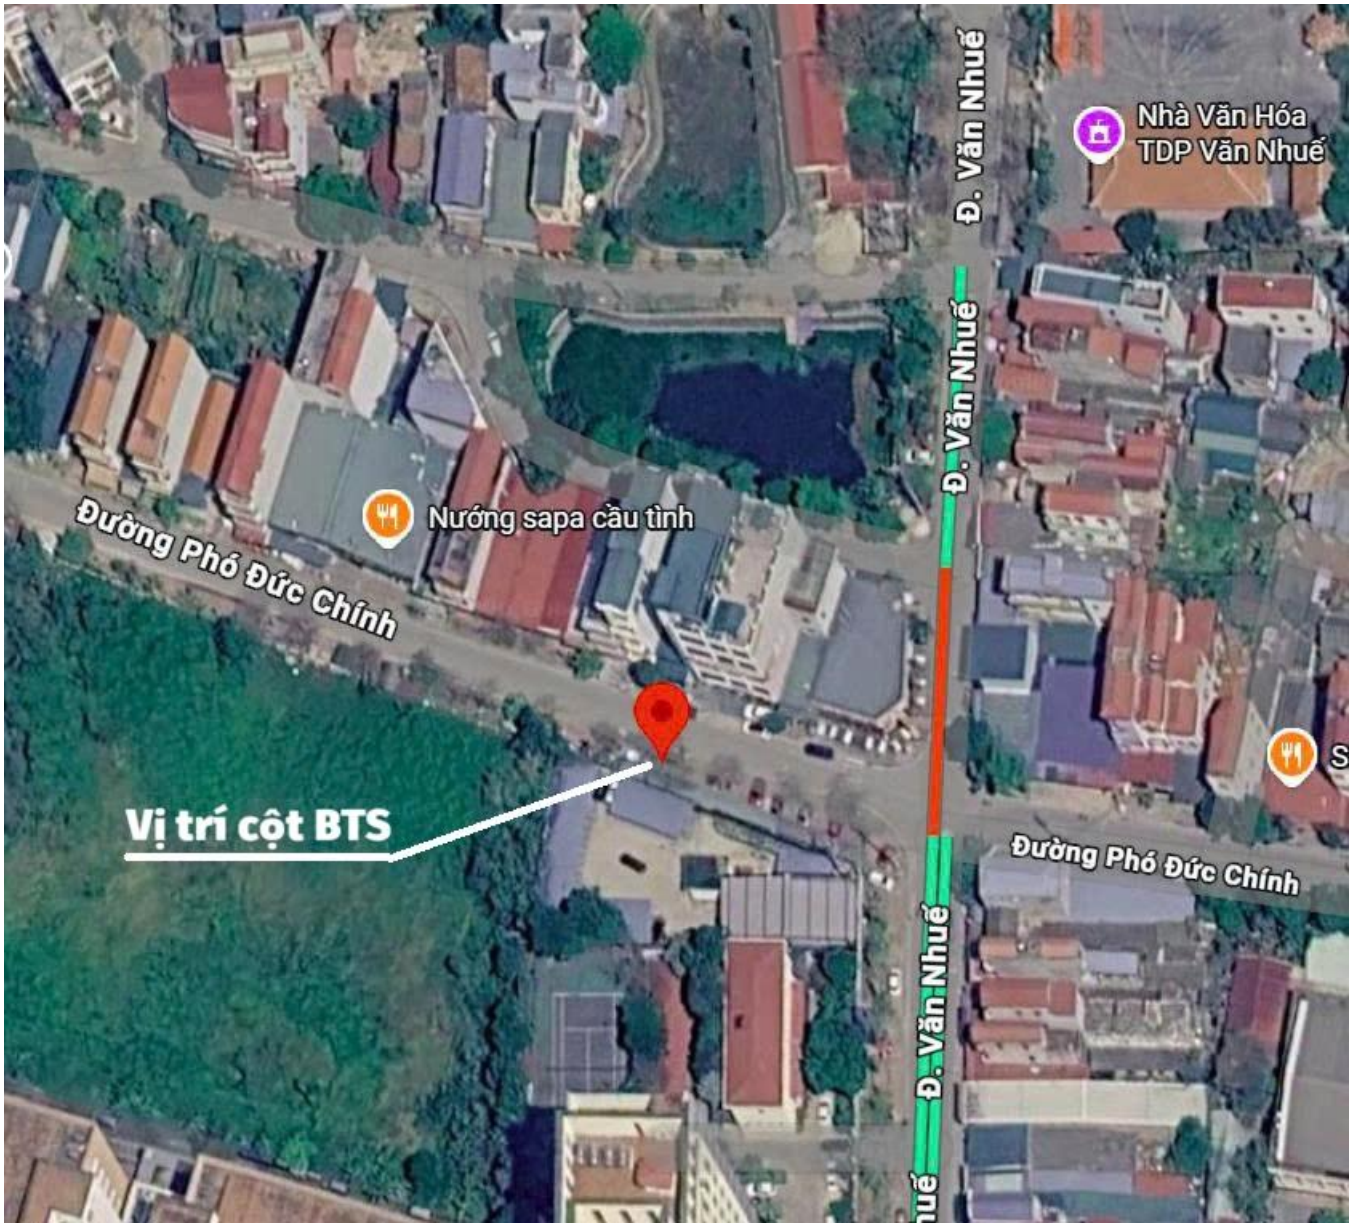
VỊ TRÍ XÂY DỰNG CỘT BTS
Đường Phó Đức Chính, phường Mỹ Hào (phía Nam đường) cạnh Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên
